

Compte rendu du stade

Saint Chamassy le 8/10/2026

- 45 Litres de GNR
- 2 Stagiaires et Manu
- 38 Heures de travail
- 1 Pelle de 3T (25 heures)
- 1 Tracteur (6 heures)
- 1 Camion
- 20 T de calcaire en 0/20
- 260 ml de fossé



Livraison matériel et matériaux



Livraison matériel et matériaux



Entrée du stade

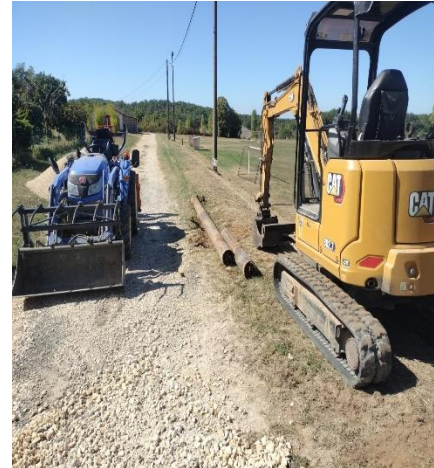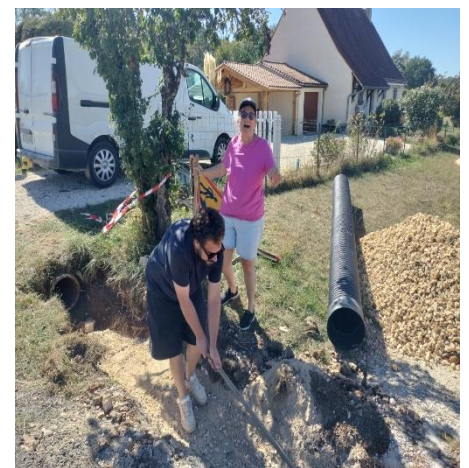

Entrée du stade




Côté vestiaire



Côté route



Fond du stade

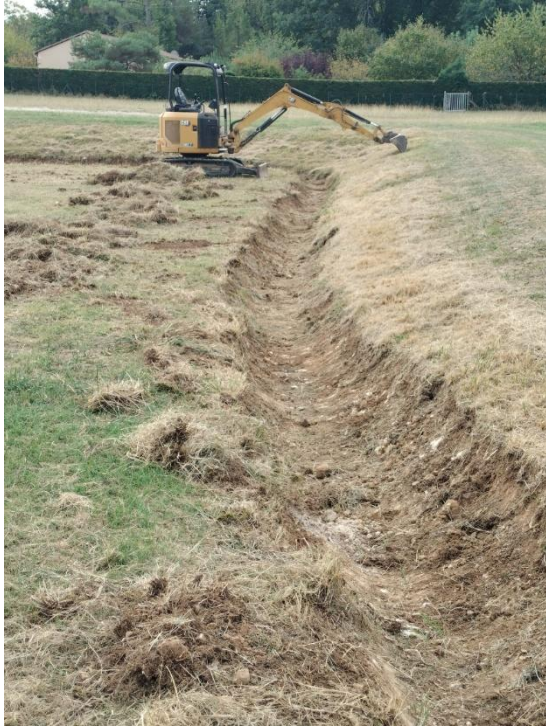

Evacuation des eaux



Mise aux normes de l'électricité



Budget

STADE

STADE							
Objet	Désignation	Fournisseur	Estimation		Réal		Ecart
			Montant HT	Montant TTC	Montant HT	Montant TTC	
Vestiaire	Mise en conformité de l'électricité suivant rapport	HOMELEC	1 890,00 €	2 268,00 €	1 890,00 €	2 268,00 €	0,00 €
Bornage	Fourniture et pose de 3 bornes	AGEFORT	785,00 €	942,00 €		- €	-942,00 €
Fossé	Curage des fossés sur 260 ml	Régie	- €	- €	- €	- €	
Fossé	Location mini pelle (2 jours)	BATI LOCATION	600,00 €	720,00 €	502,00 €	602,40 €	
Entrée stade	Tuyau noir plastique	M+	140,00 €	168,00 €	140,00 €	168,00 €	
Entrée stade	Location mini pelle (2 jours)	BATI LOCATION	600,00 €	720,00 €			
Entrée stade	Calcaire 0.20 environ 20 T	CDC	500,00 €	600,00 €	500,00 €	600,00 €	
Entrée stade	Calcaire 0.80 environ 40 T sur 15 ml de longueur	CDC	1 000,00 €	1 200,00 €	1 000,00 €	1 200,00 €	0
Eclairage stade	Fournitures et pose de 4 projecteur LED 500W avec location nacelle	HOMELEC	4 404,00 €	5 284,80 €	4 404,00 €	5 284,80 €	
Chicane entrée stade	Buse D80 QTE 24	M+	1 632,00 €	1 958,40 €	1 632,00 €	1 958,40 €	
Chicane entrée stade	Location mini pelle (2 jours)	BATI LOCATION	500,00 €	600,00 €	500,00 €	600,00 €	
Chicane entrée stade	Calcaire 0.20 environ 10 T	CDC	250,00 €	300,00 €	250,00 €	300,00 €	
Chicane entrée stade	Béton pour buse 8 M3	JPM	2 240,00 €	2 688,00 €	2 240,00 €	2 688,00 €	
TOTAL			17 449,20 €		15 669,60 €		-1 779,60 €

- 1779 €
